

## Bilaga 1 Beslutsträd och tidplan

Denna bilaga är en av leveranserna från projektet Fas 1 - Inriktningen. Bilagorna ska utgöra underlag för de beslut som ska fattas av kongresserna respektive förbundsmötet under 2023 gällande fortsatt arbete kring ny organisationsform. Bilagorna beskriver olika aspekter och frågeställningar (t.ex. möjliga ekonomiska eller juridiska konsekvenser av olika förslag och scenarion) som är av betydelse för att kunna fatta beslut om inriktningen på det fortsatta arbetet inom projektet och med en ny organisationsform. Bilagorna är ett underlag till kongresserna respektive förbundsmötet på samma sätt som t.ex. revisionsberättelsen. Det går alltså inte att ändra på bilagorna. Det går heller inte att lägga förslag som rör innehållet i bilagorna.

Bilagorna strävar efter att presentera fakta och analyser baserade på fakta. Bilagorna gör inga värderingar och ger inga rekommendationer så länge det inte handlar om att peka ut juridiska eller liknande konsekvenser.

### Inledning

I arbetet med att analysera olika möjligheter till ny organisering av de fyra förbunden är det centralt att i ett tidigt skede få en övergripande uppfattning om hur ett eventuellt fortsatt arbete skulle kunna genomföras. Det handlar om att ta fram ett beslutsträd, dvs. en sammanställning av vilka val som behöver ske i en eventuell framtida process, hur dessa beslut påverkar varandra, i vilken ordning besluten behöver tas etc. Det handlar också om att koppla beslutsprocessen till en tidsplan så att beslut kan beredas och presenteras i rätt tid inför kommande beslutsmöten etc.

En leverans i projektet Fas 1 - Inriktningen är därför ett beslutsträd och en tidsplan för det eventuella arbetet med en ny framtida organisering av verksamheterna i de fyra förbunden. I detta PM presenteras ett beslutsträd och en tidplan utifrån de olika möjliga alternativa beslutskombinationerna vid kongresser och förbundsmöte.

### Metod

Arbetet i denna del har genomförts genom att data samlats in via en kombination av dokumentanalyser, samtal etc. Resultat från genomförda dialogmöten, enkäter, djupintervjuer och övriga insatser i projektet har också påverkat resultatet.

### Genomförande

Arbetet med denna bilaga har skett löpande under projektets gång. Synpunkter, kommentarer, förslag etc. har samlats in under möten med medlemmar, förtroendevalda och anställda. Stadgar har granskats etc.

Resultat

Övergripande tidslinje


Vår 2023	Sommar 2023	Höst 2023	Vår 2024	Höst 2024	2025
FAS 1: INRIKTNINGEN		FAS 2: UTREDNINGEN		FAS 3: GENOMFÖRANDET	
	Kongresser UNF, Junis, IOGT-NTO	Förbunds-möte NSF		Extra kongresser och FM	
Projekt: Inriktningen			Nytt projekt: Utredning		Projekt övergår till genomförande och ansvar i ordinarie verksamhet
Dialogmöten och kommunikation			Dialoger och kommunikation		
Inventering utredningsbehov			Utredningar och konsekvensanalyser		Åtgärder enligt beslut och nödvändiga implementeringsbeslut
Gemensamma förbundsstyrelsediskussioner			Gemensamma förbundsstyrelsediskussioner		
Gemensamt förslag till inriktningsbeslut till kongresser och förbunds-möte tas fram			Gemensamt förslag tas fram till extra kongresser och extra förbunds-möte		Överföring och hantering av tillgångar, avtal, medlemskap, huvudmannaskap om så är relevant
De fyra förbundsstyrelserna fattar beslut om att lägga fram förslag om utredning			De fyra förbundsstyrelserna fattar beslut om att lägga fram förslag om ny organisationsform		Verksamhetsövergångar

Beslutsträd

I fas 1 Inriktningsfasen är processen beroende av fyra beslut vid organisationernas högsta beslutande organ för att alla förbund ska gå vidare till fas 2 Utredningsfasen. I ett antal scenarier är det två eller tre förbund som beslutar om att gå vidare.

Om det blir olika beslut vid förbundens kongresser och förbundsmöten så utesluter det inte att processen fortsätter för de förbund som beslutat att gå vidare till utredningsfasen.

Efter beslut vid kongresser och förbundsmöte kommer en avstämning om vägen fram att göras i riksstyrelsen och respektive förbundsstyrelse. Eftersom NSF har förbundsmöte först under hösten 2023 innehåller beslutsträdet ett antal olika scenarios. Detta är en schematisk bild för att göra besluten överskådliga utifrån när de fattas och ska inte ses som en bedömning av vilka beslut som kommer att fattas.

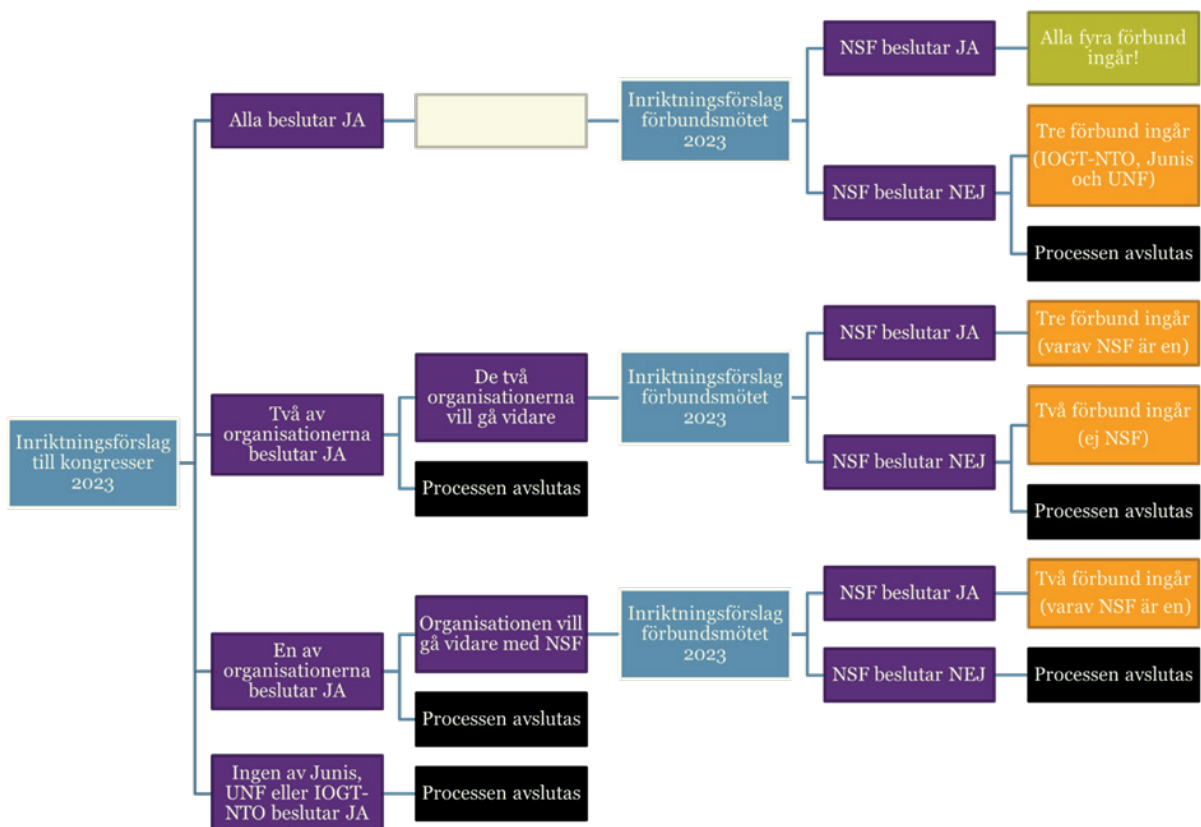

Avgränsning i tid

Projekt Inriktningen gäller för Fas 1 och avslutas i samband med riksstyrelsemötet den 14 november 2023. Om processen avslutas i samband med sommarens kongresser får projektets uppdrag lyftas till beställare för anpassningar.

Projektet Fas 2 Utredningsfasen påbörjas efter beslut om att inleda en utredning.

### Slutsatser

Den tidsplan och det beslutsträd som var en del av den fastställda projektplanen har uppdaterats och modifierats utifrån vad som framkommit under arbetet i projekt Fas 1 Inriktningen.
